Quanto custou o Squad Aurora?

João Felipe Costa Neves

Site das entregas: https://joaofelipe-citi.com.br/

0. Resumo para a diretoria

O Squad Aurora entregou com 180 h a mais (480 h contra 300 h) e 4 semanas de atraso, por 5 mudanças de escopo nunca renegociadas. A R$ 40/h, o CITi cobrou R$ 12.000 por R$ 19.200 de trabalho: **R$ 7.200 não cobrados**. Dev A e Dev B fizeram 53% das horas extras, e reconhecimento e carga foram as notas que mais caíram. **Prioridade: processo formal de mudança de escopo no contrato.**

1. Diagnóstico do clima

O problema está no processo, não nas pessoas. Ordenei os problemas pela queda na pesquisa.

Problema	Dados que sustentam
Esforço extra sem reconhecimento	"Me sinto reconhecido(a)" caiu de 3,8 para 2,6 (−1,2), a maior queda. Comentário 2: alguém virou a madrugada antes da entrega e ninguém comentou.
Carga insustentável	Carga sustentável: 3,5 para 2,4 (−1,1), a pior nota. O projeto durou 12 semanas em vez de 8 e usou 480 h em vez de 300 h.
Escopo mudando sem comunicação	Comunicação com a gerência: 4,0 para 3,2 (−0,8). Comentário 1: o time só soube das mudanças na entrega. Foram 5, nenhuma renegociada.
Risco de perder membros	Comentário 4: alguém pensa em sair do projeto. Clareza de papel e oportunidade de desenvolvimento também caíram (−0,2 cada).

O que está saudável: "Me sinto parte do CITi" segue em 4,3, a nota mais alta, e o comentário 3 diz que o problema não é com as pessoas do time. Isso define o tipo de solução: o time não precisa de integração, precisa de regras claras de escopo e de carga.


2. A conta

O projeto deveria ter sido cobrado em **R$ 19.200** e foi cobrado em R$ 12.000: **R$ 7.200 deixaram de entrar**, 37,5% do valor do trabalho real. A conta passo a passo está no apêndice A.

Os passos 5 a 7 da conta mostram o essencial: as mudanças não renegociadas explicam 100% do estouro. O time não estimou mal o projeto; entregou de graça 180 h pedidas a mais, a última delas na semana 10, depois do prazo original. A causa está no contrato: "serão avaliadas pela equipe" não diz quem avalia nem que uma mudança gera nova cobrança ou novo prazo.

3. Quem pagou a conta

As 180 h extras não se dividiram por igual: Dev A e Dev B, 2 dos 8 membros, absorveram 95 h, ou 53% do total.

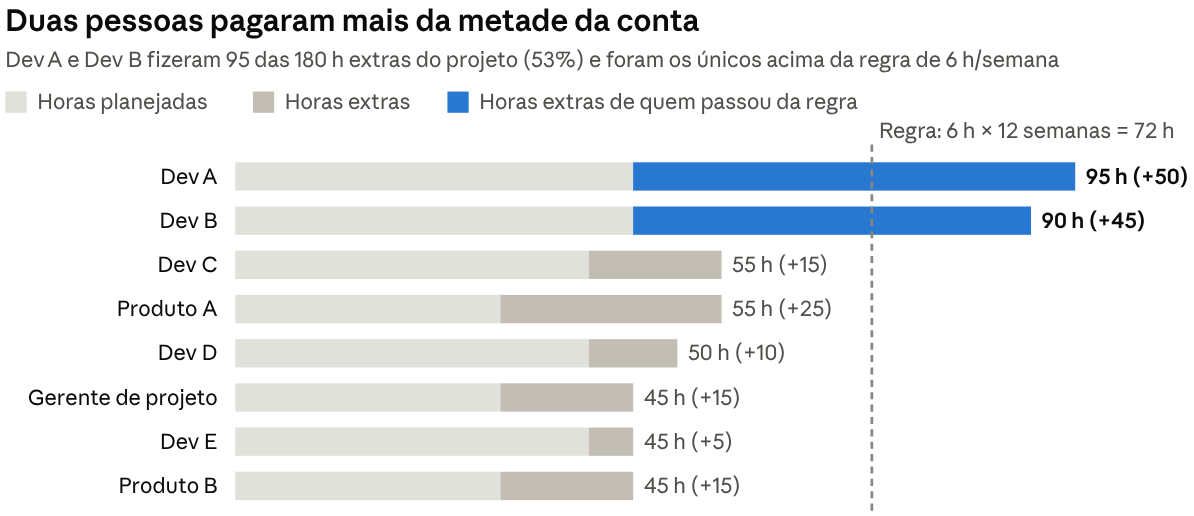

Seção 2.4 do desafio · horas totais de cada pessoa nas 12 semanas do projeto

Na média, o time até ficou dentro da regra: 480 h ÷ (8 pessoas × 12 semanas) = 5 h por pessoa por semana. O problema foi a concentração. Dev A e Dev B já começaram com o plano mais apertado (45 h em 8 semanas, 5,6 h/semana, quase no limite) e fecharam com 15 h/semana nas 3 últimas semanas, 2,5 vezes a regra.

Isso aparece no clima. As duas maiores quedas são justamente carga (−1,1) e reconhecimento (−1,2), e o comentário 2 descreve uma madrugada antes da entrega, o mesmo período do pico. Na prática, o dinheiro que o CITi não cobrou saiu das horas dessas pessoas: só as 95 h extras de Dev A e Dev B valem R$ 3.800 pelo valor-hora do orçamento.

4. Plano de ação

Ação	Resolve	Responsável	Prazo	Como medir
1. Processo formal de mudança de escopo. Só começa com novo valor ou prazo aprovado por escrito; o pedido registra quem absorve as horas.	Ambos	Diretoria, com o gerente de projeto	30 dias	100% das mudanças registradas e renegociadas
2. Controle semanal de carga. Acima de 6 h/semana por 2 semanas, GG é avisada.	Ambos	Gerente de projeto, com GG	2 semanas	Ninguém acima da regra por mais de 2 semanas
3. Retrospectiva e reconhecimento. Agradecimento nominal ao esforço; vira ritual de fim de projeto.	Pessoas	GG e o gerente de projeto	2 semanas	Reconhecimento em 3,5 ou mais na próxima pesquisa
4. 1:1 com os 8 membros do squad (seção 5).	Pessoas	GG	3 semanas	Ninguém sai do projeto sem uma conversa antes

Prioridade: a ação 1, a única que ataca a causa: sem ela, o próximo squad repete as 180 h não cobradas e a sobrecarga.

5. Uma conversa

Princípios. Faço o mesmo 1:1, com o mesmo roteiro, com os 8 membros, na mesma semana. Assim ninguém é apontado. Não cito a pesquisa nem os comentários, e não tento descobrir quem escreveu o quê.

Como eu abriria. Agradeço pela entrega e explico o objetivo: "Estou conversando com todo mundo do Aurora para entender como foi o projeto para cada pessoa e o que precisa mudar no próximo. Não é avaliação de desempenho. O que você me contar fica entre nós;

se algo virar mudança para o time, levo sem dizer de onde veio e só com o seu ok."

Perguntas que eu faria.

1. "Olhando para essas 12 semanas, como foi o projeto para você?" Deixa a pessoa escolher por onde começar.
2. "Teve algum momento que pesou mais? O que estava acontecendo?" Abre espaço para falar de carga e de escopo sem que eu cite a pesquisa.
3. "Você sentiu que o seu esforço foi visto?" Toca no reconhecimento, a maior queda do clima.
4. "O que precisaria ser diferente para o próximo semestre valer a pena para você?" Abre espaço para a dúvida sobre continuar, sem perguntar diretamente se a pessoa quer sair.

O que eu faria com o que ouvir. Escuto mais do que falo e não prometo o que não depende de mim. O que é individual (carga, papel, vontade de mudar de função) vira um combinado concreto entre nós, com retorno marcado em 2 semanas. O que se repete em várias conversas vai para a diretoria de forma agregada e sem nomes, alimentando as ações 1 a 3. Se a pessoa decidir sair do projeto, respeito a decisão e ajudo a encontrar outro projeto ou função: o pertencimento ao CITi segue alto (4,3), então o desgaste é com o projeto, não com a empresa.

Apêndice

A. A conta, passo a passo

Passo	Cálculo	Resultado
1. Valor da hora no orçamento	R$ 12.000 ÷ 300 h	R$ 40/h
2. Valor das horas reais	480 h × R$ 40/h	R$ 19.200
3. Valor não cobrado	R$ 19.200 − R$ 12.000	R$ 7.200
4. Valor efetivo da hora	R$ 12.000 ÷ 480 h	R$ 25/h (−37,5%)
5. Horas das mudanças de escopo	30 + 25 + 60 + 25 + 40	180 h
6. Estouro de horas do projeto	480 h − 300 h	180 h
7. Valor das mudanças não renegociadas	180 h × R$ 40/h	R$ 7.200

B. Quanto custou cada mudança de escopo

#	Semana	Mudança	Horas	Cálculo	Valor não cobrado
1	3	Nova tela de cadastro	30 h	30 × R$ 40	R$ 1.200
2	4	Troca da identidade visual	25 h	25 × R$ 40	R$ 1.000
3	6	Integração com pagamento	60 h	60 × R$ 40	R$ 2.400
4	8	Novo fluxo de login (última semana do prazo original)	25 h	25 × R$ 40	R$ 1.000
5	10	Relatório em PDF (depois do prazo original)	40 h	40 × R$ 40	R$ 1.600
		Total	**180 h**	180 × R$ 40	**R$ 7.200**
